



INFORME N°11 – 2026

CONCEJO MUNICIPAL

Lic. Rugeli Morales Rodriguez





ACCIONES ADMINISTRATIVAS

Lic. Rugeli Morales Rodriguez



AYUDA HUMANITARIA

- ❖ El Viernes 27 de febrero 2026 se realiza ayuda humanitaria a jóvenes y niños de la comunidad conocida (Celines – Margarita)
- ❖ Se brinda la ayuda y apoyo a 25 jóvenes con:
- ❖ Kit de cuadernos
- ❖ Bolsos
- ❖ Zapatos



PROYECTO PUENTES PROERI - EMERGENCIA

- ❖ Mediante el oficio **CARTA-CONAVI-CA-DIE-GCTR-885-2026** el **CONAVI** informa el estado actual del proyecto de los puentes ubicados en el cantón de Talamanca (**Quebrada Daytona, Quebrada Caña 2 y Río Cocles**).
- ❖ **Actualmente:** El proyecto se encuentra en la fase de elaboración de los diseños finales.
- ❖ Están siendo desarrollados por el contratista adjudicado, el Consorcio **PROERI-CONAVI-0024 (conformado por las empresas Ingeniería Estrella S.A. y BEL Ingeniería S.A.)**.
- ❖ Se estima que la orden de inicio a ejecución de obras a finales del mes de mayo de 2026.

PROGRAMACIÓN DE EJECUCIÓN POR SITIO

- ❖ Sitio N.º 01 (Quebrada Quiebra-Caña Daytonia): **150 días calendario.**
- ❖ Sitio N.º 02 (Quebrada Quiebra Caña 2): **150 días calendario.**
- ❖ **Sitio N.º 03 (Río Cocles): 150 días calendario.**



MINISTERIO DE
OBRAS PÚBLICAS
Y TRANSPORTES

GOBIERNO
DE COSTA RICA

CONSEJO NACIONAL
DE VIALIDAD

11 de marzo de 2026
CARTA-CONAVI-CA-DIE-GCTR-885-2026
Página 1 de 3

Señor
Rugeli Morales Rodríguez
Alcalde
Municipalidad de Talamanca

ASUNTO: Respuesta a Oficio N.º OF.A.M. T-E-0033-2026. Proyecto: CONTRATACIÓN DE ESTUDIOS, DISEÑO Y REHABILITACIÓN DE OBRAS EN PUENTES PU-LOTE 5-1, contrato No: 2024 LPI-0024-PROERI-CONAVI.

Estimado señor:

En atención a su oficio OF.A.M. T-E-0033-2026, mediante el cual solicita información actualizada sobre las intervenciones en los puentes ubicados en el cantón de Talamanca (Quebrada Daytona, Quebrada Caña 2 y Río Cocles), me permito informar lo siguiente:

1. Estado Actual del Proceso e Inicio de Obras

El proyecto fue publicado a licitación y adjudicado durante el año 2025, y en el mes de octubre del mismo año se emitió la orden de inicio al contratista para iniciar con la etapa de estudios y diseños. Actualmente, el proyecto se encuentra en la fase de elaboración de los diseños finales, los cuales están siendo desarrollados por el contratista adjudicado, el Consorcio PROERI-CONAVI-0024 (conformado por las empresas Ingeniería Estrella S.A. y BEL Ingeniería S.A.).

Conforme al cronograma de actividades, se estima que la orden de inicio para la fase de ejecución de obras en sitio se emitirá a finales del mes de mayo de 2026.

2. Programación de Ejecución por Sitio

Para efectos de su planificación y la comunicación con las comunidades involucradas, el plazo inicial de ejecución para cada estructura en el cantón es el siguiente:

- Sitio N.º 01 (Quebrada Quiebra-Caña Daytonia): 150 días calendario.

CONMEMORACIÓN DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER

- ❖ El miércoles 11 de marzo se conmemoró el Día Internacional de la Mujer (8 de marzo)
- ❖ Se impartieron charlas, Talleres, Dinámicas sobre **“La fuerza de la Mujer cambia la historia”** por parte de la representación de FEMUCARIBE
- ❖ Participación: 30 Mujeres






DEPARTAMENTO AMBIENTAL

Lic. Rugeli Morales Rodriguez



MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS ORDINARIOS Y VALORIZABLES

MARZO DEL 2026		
FECHA	RUTA	PESO EN KG
9/3/2026	Amubri	236,6
	Suretka-Rancho Grande-Volio	161,3
10/3/2026	Katsi	345,3
	Chase-Bambú	225,5
TOTAL		968,7

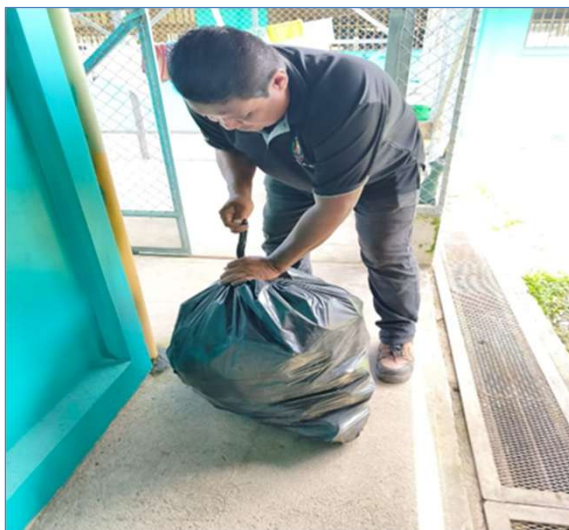

MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS ORDINARIOS Y VALORIZABLES

- ❖ A partir del mes de abril se iniciarán las campañas de reciclaje en las comunidades de **Cahuita y Puerto Viejo**, las mismas se realizarán en un horario de **9:00 am a 2:00 pm**


SE RECIBIRÁN LOS SIGUIENTES MATERIALES:

- ❖ Tetrapack, vidrio, botellas plásticas, hojalata, cartón y aluminio
- ❖ **NO SE RECIBIRÁN VIDRIOS DE VENTANA, BOMBILLOS, ENVASES DE MEDICAMENTOS, VIDRIOS QUEBRADOS.**

Cahuita (Parque Cahuita) Segundos lunes del mes	Puerto Viejo (frente a Bar Maritza) segundos martes del mes
Lunes 13 abril	Martes 14 abril
Lunes 11 mayo	Martes 12 mayo
Lunes 08 junio	Martes 09 junio
Lunes 13 julio	Martes 14 julio
Lunes 10 agosto	Martes 11 agosto
Lunes 07 setiembre	Martes 08 setiembre
Lunes 12 octubre	Martes 13 octubre
Lunes 9 noviembre	Martes 10 noviembre
Lunes 14 diciembre	Martes 15 diciembre

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE SITIOS PÚBLICOS

Fecha	Lugar	Actividad
09/03/2026	Distrito de Sixaola Puente Binacional	Chapia y limpieza

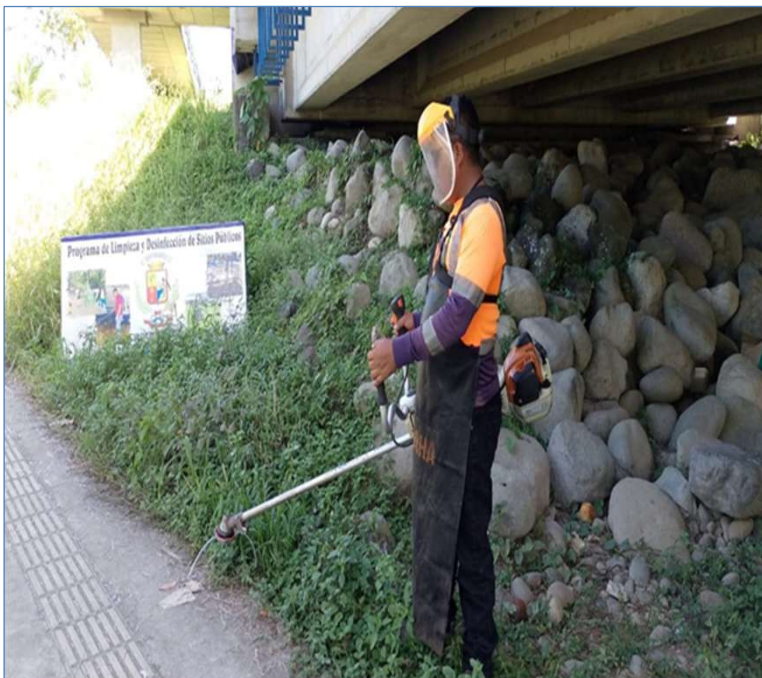



DEPARTAMENTO VIAL

Lic. Rugeli Morales Rodriguez




INFORMACIÓN MANTENIMIENTO RUTINARIO

CAMINO	KM	ACCIONES	AVANCE
7-04-010 Camino La Unión Cahuita	2,0 Km	✓ Mantenimiento con colocación de TSB2, reforzando el camino para una mejor durabilidad.	95%




AVANCE DE TRABAJOS EN CAMINO 7-04-010

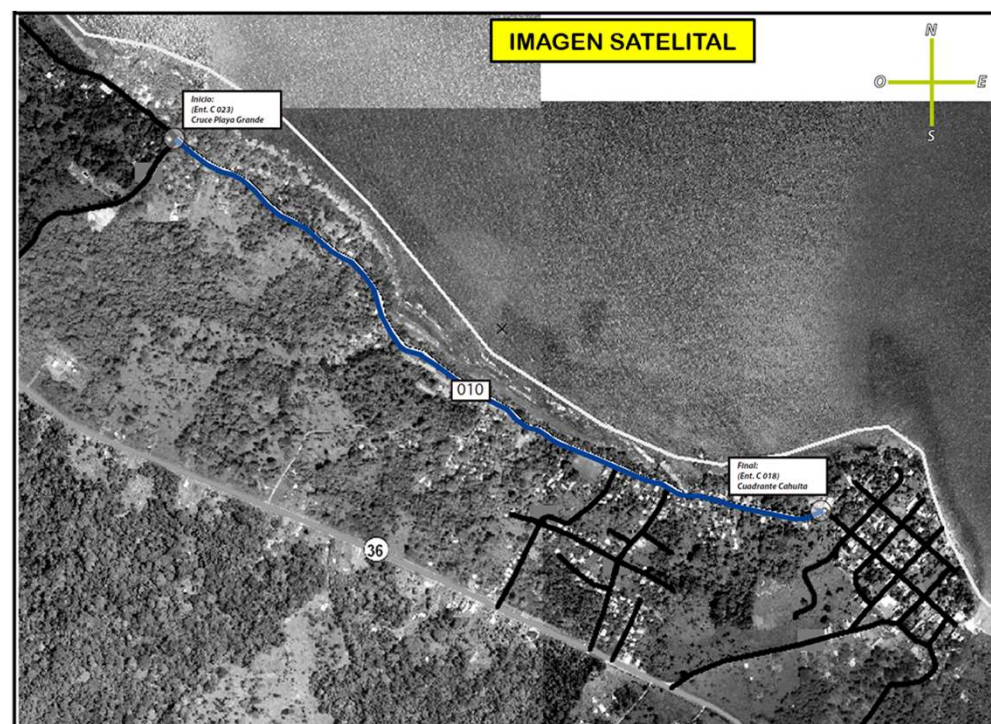


INFORMACIÓN MANTENIMIENTO RUTINARIO

CAMINO	KM	M Cubicos	ACCIONES	AVANCE
7-04-021 San Rafael de Bordon	1,15 Km	204 M³	✓ Limpieza de cunetas ✓ Colocación de lastre. ✓ Nivelación y conformación de superficie de ruedo. ✓ Compactación de la superficie de ruedo.	10%

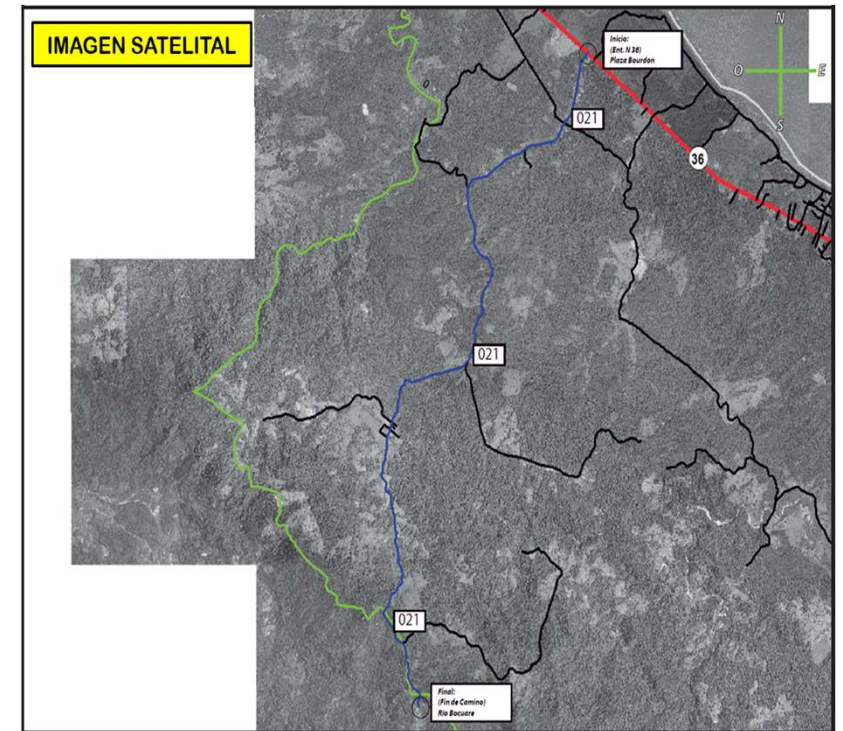


INFORMACIÓN MANTENIMIENTO RUTINARIO

CAMINO	KM	M Cubicos	ACCIONES	AVANCE
7-04-034 Calle Berto	900 mtrs	144 M³	✓ Limpieza de cunetas ✓ Colocación de lastre. ✓ Nivelación y conformación de superficie de ruedo. ✓ Compactación de la superficie de ruedo.	100%

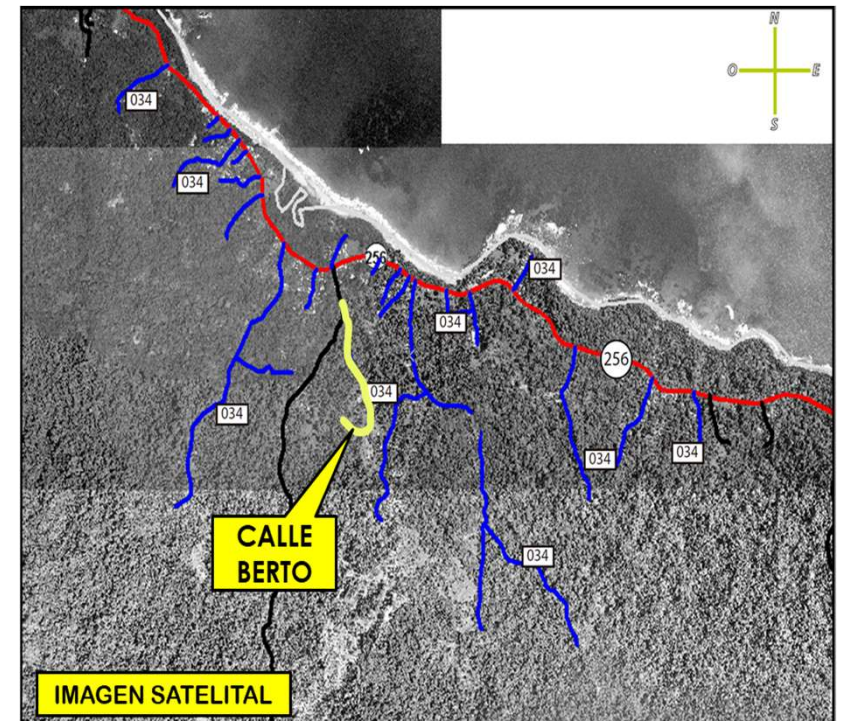


INFORMACIÓN MANTENIMIENTO RUTINARIO

CAMINO	KM	M Cubicos	ACCIONES	AVANCE
7-04-034 Calle Olé Caribe	4,0 Km	180 M³	✓ Limpieza de cunetas ✓ Colocación de lastre. ✓ Nivelación y conformación de superficie de ruedo. ✓ Compactación de la superficie de ruedo.	100%

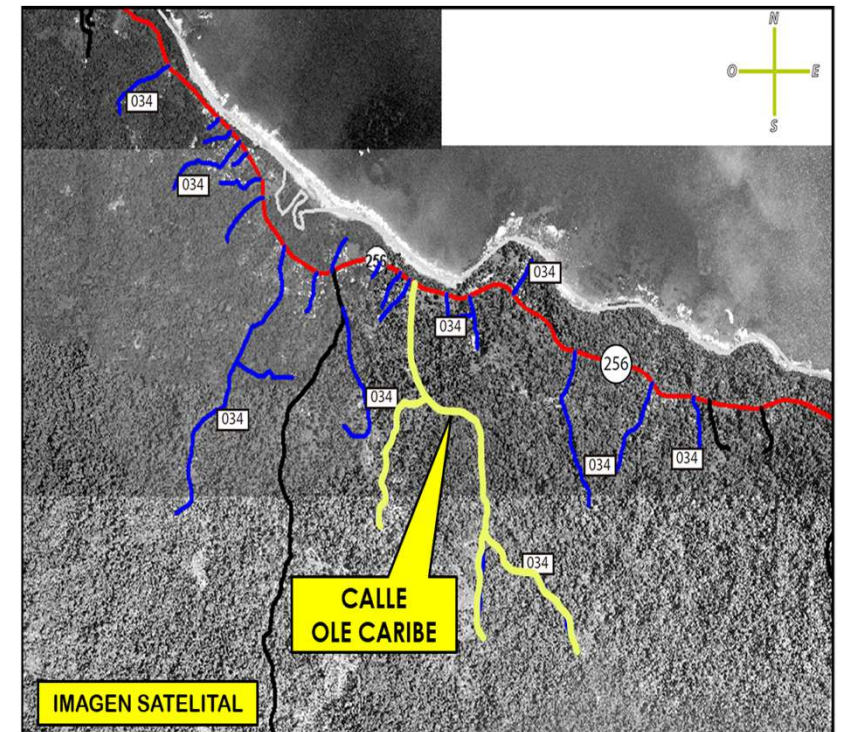


INFORMACIÓN MANTENIMIENTO RUTINARIO

CAMINO	KM	M Cubicos	ACCIONES	AVANCE
7-04-034 Calle El Tucán	852 mts	84 M³	✓ Limpieza de cunetas ✓ Colocación de lastre. ✓ Nivelación y conformación de superficie de ruedo. ✓ Compactación de la superficie de ruedo.	40%

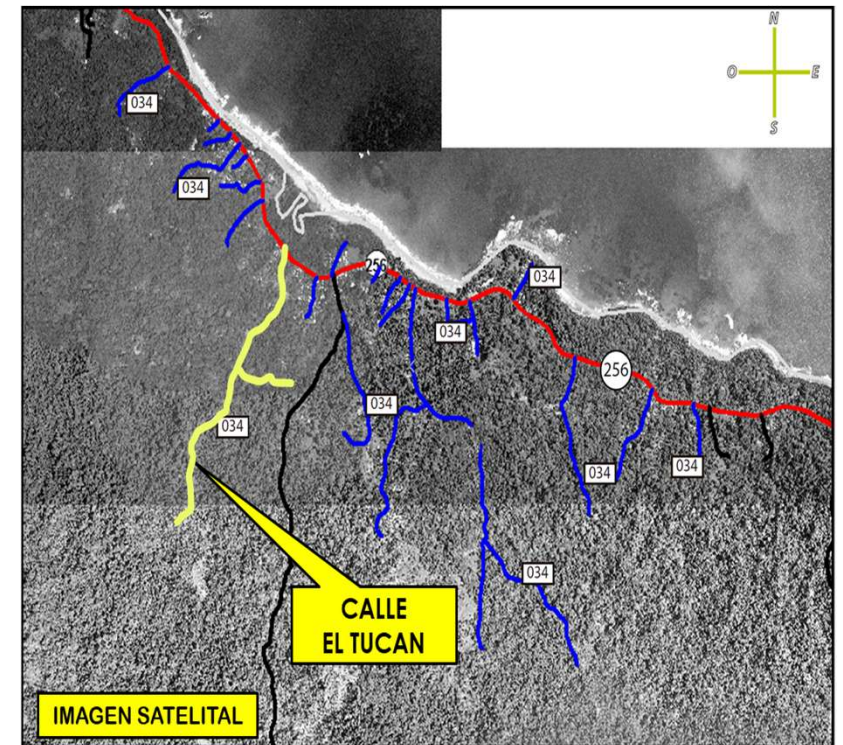

INFORMACIÓN MANTENIMIENTO RUTINARIO

CAMINO	KM	M Cubicos	ACCIONES	AVANCE
7-04-075 Olivia El Botadero	2,40 km	300 M³	✓ Limpieza de cunetas ✓ Colocación de lastre. ✓ Nivelación y conformación de superficie de ruedo. ✓ Compactación de la superficie de ruedo.	100%

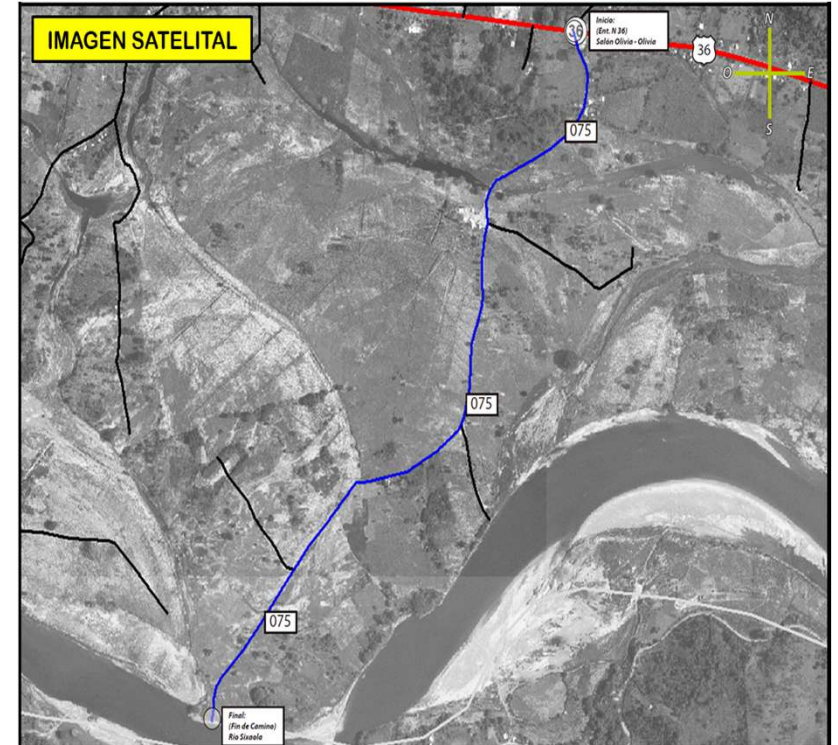

ATENCIÓN POR EMERGENCIA



Obras mancomunadas CNE y Municipalidad de Talamanca

Ubicación: Dique Gavilán Canta.

Trabajos: Reparación del Dique.

Total de horas contratadas: 320 horas



ATENCIÓN POR EMERGENCIA



Obras mancomunadas CNE y Municipalidad de Talamanca

Ubicación: Dique en río Lary, en los cruces por SOS, y Coroma

Trabajos: Reparación del Dique

Inversión mas de 10 millones de colones

Total de horas contratadas: 300 horas



ATENCIÓN POR EMERGENCIA




Obras mancomunadas CNE y Municipalidad de Talamanca

Ubicación: paso Amubre – Katsi

Trabajos: Reparación del Paso

Total de horas contratadas: 320 horas

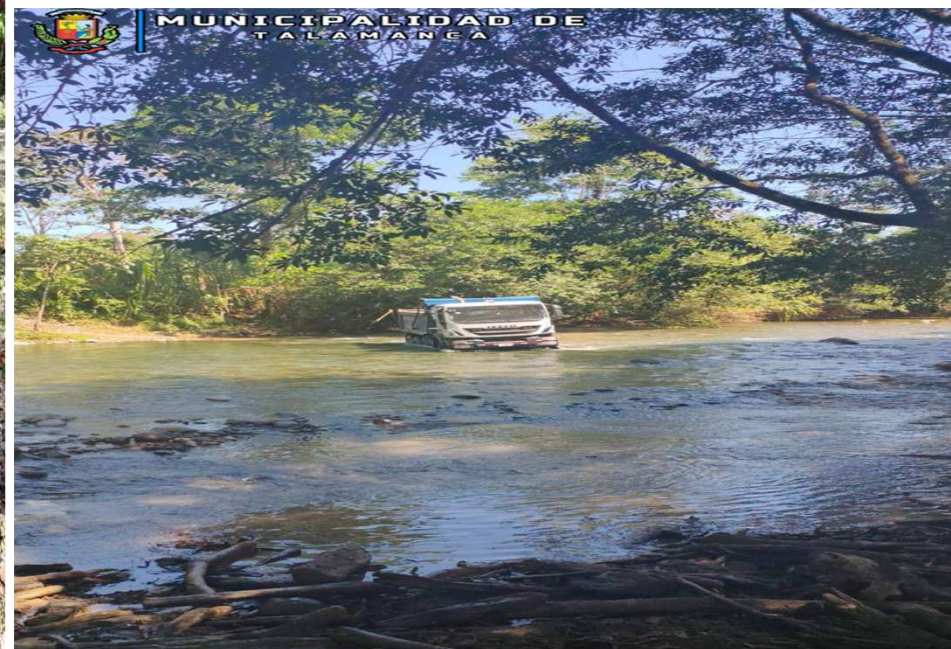

MERCADO DE SIXAOLA

- ❖ Juegos infantiles área frontal y posterior
- ❖ Se detallan paredes para pintura
- ❖ Escalera en área trasera del proyecto
- ❖ Repellos en estructura del PTAR
- ❖ Pintura en estructuras metálicas
- ❖ Enchapes en áreas de baños y cocinas
- ❖ Fundación y paredes del basurero del proyecto
- ❖ Avance del proyecto del 96%.





OTROS



❖ Acuerdo: Adjudicación Aceras de Volio

❖ Rendición de cuentas 2025



Lic. Rugeli Morales Rodriguez





GRACIAS

Lic. Rugeli Morales Rodriguez

