

PRINCIPALES PROYECTOS MUNICIPALES DEL CANTÓN DE TALAMANCA

Municipalidad de Talamanca
2024-2028

Un camino de Esperanza

25 enero del 2025



PROYECTOS RELEVANTES BRATSI



EMBELLECIMIENTO BRIBRI

- Construcción de ACERAS centro Bribri
- Mejoras pluviales (Cunetas de concreto)
- Colocación asfalto de aproximadamente 800m




Etapa 1: Aceras frente
Clínica y Municipalidad

Etapa 2: Atención centro
Bribri

Inversión:
¢114,800,000.00

Detalle acera con losa táctil ley 7600 y cordón pluvial

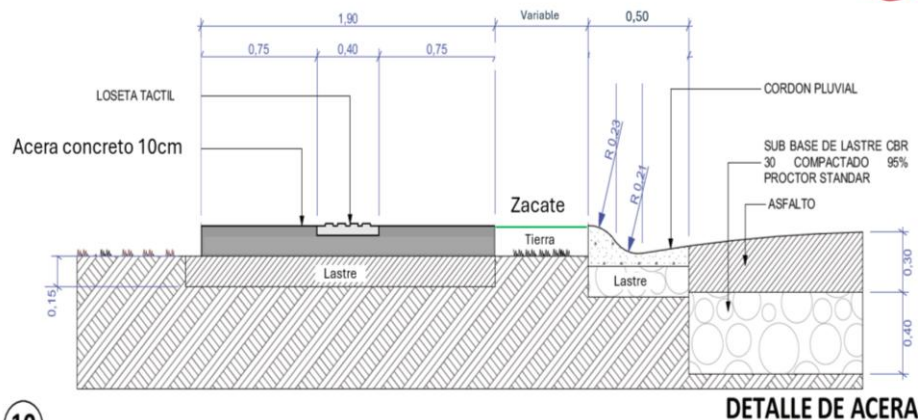

➤ **16/sept/2024** Se aprueba por parte del equipo técnico de JAPDEVA la propuesta del Proyecto, Continua para

➤ Proyecto se encuentra inscrito en MIDEPLAN N° Registro: **003458**

➤ **Monto proyecto:** Más de ¢10mil millones de colones

➤ **Alcance del proyecto:** Asfaltado 24km, aceras peatonales, cunetas revestidas, pasos de alcantarilla, muros de gaviones y ordenamiento con señalización vial (Ejemplo Puerto viejo).



- Se envía propuesta a JAPDEVA para asfaltados en Bratsi.

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	MONTO	APORTE JAPDEVA	APORTE MUNICIPALIDAD	PROPUESTA DE EJECUCIÓN	
1	CAMINO C7-04-114 / BRATSI (Cuadrantes de Suretka) : 1,00km	km	1,00	¢343 476 309,55	¢326 672 526,55	¢16 803 783,00	FIRMA DE CONVENIO PRIMER SEMESTRE 2025	INICIOS DE PROCESOS DE CONTRATACIÓN Y EJECUCIÓN SEGUNDO SEMESTRE 2025
2	CAMINO C7-04-19 / BRATSI (Bribri - Suretka): 7,80km	km	7,80	¢2 753 726 047,00	¢2 632 268 935,00	¢121 457 112,00	FIRMA DE CONVENIO SEGUNDO SEMESTRE 2025	INICIOS DE PROCESOS DE CONTRATACIÓN Y EJECUCIÓN PRIMER SEMESTRE 2026
3	CAMINO C7-04-005 / BRATSI (Volio a Chase) : 2,00km	km	2,00	¢632 659 557,00	¢607 813 066,00	¢24 846 491,00	FIRMA DE CONVENIO SEGUNDO SEMESTRE 2027	INICIOS DE PROCESOS DE CONTRATACIÓN Y EJECUCIÓN PRIMER SEMESTRE 2028
4	CAMINO C7-04-063 / BRATSI (Volio a Río Carbón) : 1,40km	km	1,40	¢422 721 526,00	¢406 730 618,00	¢15 990 908,00		
COSTO ETAPA 4				¢4 152 583 439,55	¢3 973 485 145,55	¢179 098 294,00		
					95,69%	4,31%		
					% Aporte JAPDEVA	% Aporte Municipalidad Talamanca		

Asfalto en Bratsi
12,2km convenio -
JAPDEVA

Puente Cocolis y Shirolitos



- Se realiza traslado del puente Bailey, hasta oficinas de ADITIBRI
- Colocación corresponde al CONAVI (PENDIENTE POR CONAVI)
- Se tiene estudios de suelos MOPT, no ha finalizado el diseño de los bastiones.
- Se presenta nueva Solicitud (28 de enero 2025) para diferente colocación



CONTINUACIÓN MURO GAVIONES EN BRIBRI

- **Etap**a 1: recursos del 2024
- **Etap**a 2: Adjudicado
- **Monto adjudicado:** 15 millones
- Previsto iniciar Miércoles 05 de Febrero 2025

Número de procedimiento /Nombre de la institución	Descripción del procedimiento	Fecha/hora de publicación	Fecha/hora de apertura	Estado del con- curso
2025LD-000001-0022300001 Municipalidad de Talamanca	[LD] CONSTRUCCIÓN PARA FINALIZAR SEGUNDA ETAPA DE EMERGENCIA DE MUROS DE GAVIONES EN CAMINO C7-04-115 EN BRIBRI CENTRO, PARALELO AL RIO CARBÓN Encargado de publicación, gestión de objeciones y apertura : ANGELICA MARIA PEREIRA HERNANDEZ	09/01/2025 08:34	15/01/2025 08:00	Adjudicado



Limón, 18 diciembre 2024
DRHA-03-2024-0520 (0851)

Señor
Enrique Joseph Jackson
Departamento Vial
Municipalidad de Talamanca

REFERENCIA: atención a oficio OL-PS-DV-130-2024, solicitud de intervenciones varias RN 36, 256 y 801

Estimado señor:

En atención a su oficio OL-PS-DV-130-2024, mediante el cual solicitan intervención por:

- Ruta nacional 256:
 - o Falta de paso de alcantarilla transversal frente a Hotel Escape Caribeño
 - o Incapacidad hidráulica de dos pasos de alcantarilla en las cercanías de la escuela bilingüe de Punta Uva
 - o Incapacidad hidráulica del paso transversal en la estación 0+400
- Ruta nacional 801:
 - o Falta de protección en bastiones del puente sobre el río Carbón
- Ruta nacional 36:
 - o Incapacidad hidráulica de paso de alcantarilla transversal en el sector de la escuela de Hone Creek

Al respecto nos permitimos informarle que esta Dirección Regional, se encuentra actualmente analizando los parámetros técnicos en cada punto, para gestionar los estudios preliminares necesarios que señalen la solución de cada sitio.

La ejecución de los estudios se realizará en base a la disponibilidad presupuestaria y priorización asignada a la zona.

Con respecto a la protección de los bastiones del puente sobre el río Carbón, se encuentran en plan de inversión la ejecución de la colocación de una escollera para el I Trimestre del año 2025.

Sin otro particular,



Asfalto 1km RT-19

- Se inicio el 13 de enero inscripción proyecto ante Colegio de Ingenieros CFIA.
- Posible inicio segunda semana de febrero del 2025.

Costo aproximado:
¢317millones




**1KM ADICIONAL DE ASFALTO PARA EL CAMINO ENTRE
BRIBRI - SURETKA**



Asfaltado RN 801 DE 18 KM



- Este lunes 27 de enero del 2025 se realizó reunión técnica virtual CONAVI seguimiento inscripción de **MIDEPLAN** este 2024.
- Para presentar proyecto en canon de **JAPDEVA** 2025.

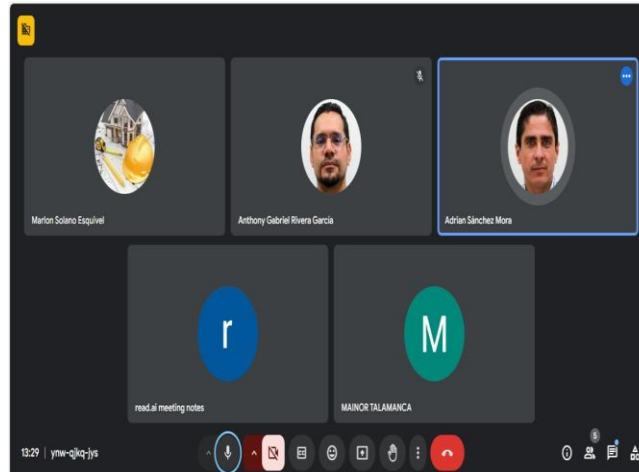

Ejemplo


Propuesta proyectos para Plaza de Futbol Bribri



DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN MEJORAS Y RECONSTRUCCION DE LAS CANCHAS DE FUTBOL DE PUERTO VIEJO Y BRIBRI TALAMANCA, LIMÓN

ITEM	NOMBRE DE PROYECTO	MONTO	APORTES POR INSTITUCIÓN	
			INDER	MUNICIPALIDAD DE TALAMANCA
2-	Diseño y Reconstrucción de la cancha de futbol en la comunidad de Bribri	€1 460 983 850,37	€1 292 783 350,37	€168 200 500,00
			91,10%	8,90%
	NOTAS:		% DE APORTES	
	1-APROBADOS POR CONSEJO TERRITORIAL			
	2-ANTEPROYECTO Y PROPUESTA COMPLETA			
	3-PENDIENTE INSCRIPCIÓN EN MIDEPLAN			

Propuesta Cancha Bribri

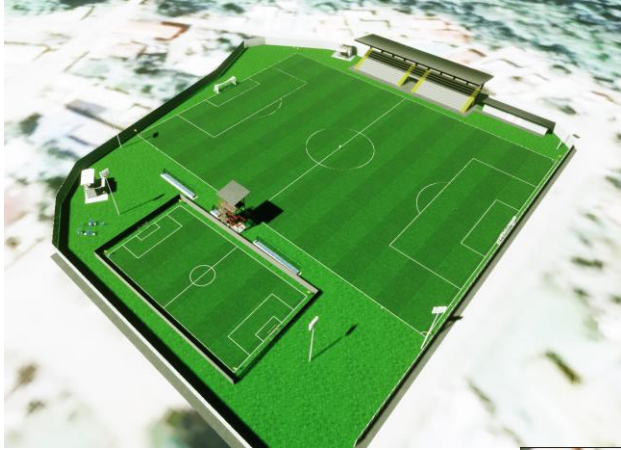

PROYECTOS RELEVANTES SIXAOLA



✓ **“PROYECTO MEJORAS EN EL MERCADO Y RECONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE SERVICIOS MÚLTIPLES DE SIXAOLA”**

INFORME RESUMEN DE AVANCE DEL PROYECTO EN EJECUCIÓN		
ITEM	DESCRIPCIÓN	ESTADO ACTUAL
1-	AVANCE FISICO GENERAL CONSTRUCCIÓN	Actualmente se lleva un 18% de avance en obras de muros, obras pluviales y rellenos.
2-	MONTO EJECUTADO APORTE JAPDEVA	EL Monto ejecutado a la fecha áporte JAPDEVA 220 millones de colones
3-	MONTO EJECUTADO APORTE MUNICIPALIDAD	Monto ejecutado a la fecha aporte Municipaliad 80 millones de cplones
4-	PRESUPUESTO AÑO 2025 PARA EJECUCIÓN	Actualmente se encuentra aprobado por la CGR 1300 millones de colones para ejecutar este 2025 (oficioDFOE-LOC-1889 DEL 18 DE DICIEMBRE DEL 2024)
5-	FINALIZACIÓN PROYECTO	La fecha de entrega proyectada según contrato para el 24 Marzo del 2026.



2-Mejoramiento de la calzada de Ruedo mediante Pavimento TSB3 y Sistema de drenaje para **10km** en las calles y cuadrante de **Sixaola centro C7-04-095 y C7-04-109**



Carta entendimiento



INSTITUTO DE
DESARROLLO RURAL

GOBIERNO
DE COSTA RICA

NOMBRE PROYECTO	ESTADO	ACCIONES
10km de TSB3 de cuadrantes de Sixaola- INDER	Ya está aprobado el proyecto por el concejo Territorial del INDER del valle de la estrella y Talamanca.	Se requiere inscribir en MIDEPLAN donde la Municipalidad será la unidad ejecutora, Inversión de ¢1500 millones



PUENTE LA ISLA




RESUMEN DE APORTES ECONOMICOS

DESCRIPCIÓN	% APORTE	MONTO APORTE
APORTE ECONOMICO MUNICIPALIDAD DE TALAMANCA	42,69%	₡184 100 000,00
APORTE ECONOMICO CORBANA	57,31%	₡247 135 000,00
TOTAL PROYECTO SIN IVA		₡431 235 000,00

Actualmente está PRE-APROBADO, sigue en estudio interno, por la Junta Directiva de CORBANA- REUNIÓN JUNTA DIRECTIVA SEGUNDA SEMANA DE FEBRERO DEL 2025



Unidad ejecutora la Municipalidad de Talamanca, se proyecta en segundo semestre para presupuesto del 2025 con la modalidad de transferencia de recursos a la Municipalidad de Talamanca.

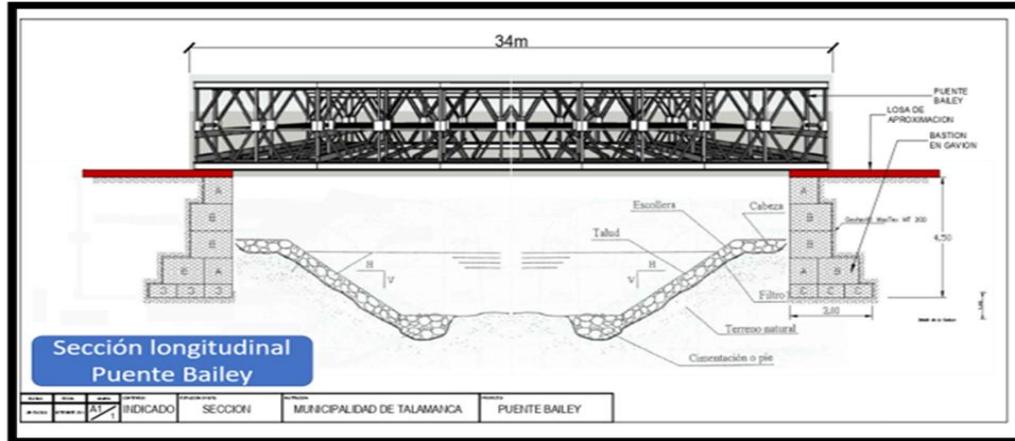

Obras Pluviales Swicth-Paraiso



ITEM	DE DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	COSTO	APORTE CORBANA	APORTE MUNICIPAL
1	Obras de concreto adicionales camino C7-04-088 comunidad del Swicth - Paraiso-Sixaola						
1.1	Construcción de cunetas revestidas de concreto f'c 210 kg/cm2 de 10cm espesor.	m2	1 044,00	€20 000,00	€20 880 000,00	€17 748 000,00	€3 132 000,00
1.2	Reparación losa existente con concreto reforzado f'c 280 kg/cm2 de 12cm en 2 Puentes del camino C7-04-088 Swicth.	m3	13,44	€345 000,00	€4 636 800,00	€3 941 280,00	€695 520,00
1.3	Lastre para excavaciones y sustitución para obras de evacuaciones pluviales	m3	50,00	€20 000,00	€1 000 000,00	€0,00	€1 000 000,00
1.4	Back hoe.	horas	90,00	€21 000,00	€1 890 000,00	€1 890 000,00	€0,00
1.5	Vagoneta	horas	50,00	€20 500,00	€1 025 000,00	€0,00	€1 025 000,00
	SUB-TOTAL				€29 431 800,00	€23 579 280,00	€5 852 520,00
	LABORATORIO DE VERIFICACIÓN				€506 636,66	€506 636,66	€0,00
	TOTAL GENERAL				€29 938 436,66	€24 085 916,66	€5 852 520,00

Avance general de
70%



PROYECTOS RELEVANTES CAHUITA



ASFALTADO PUERTO VIEJO 3,80KM – CANON JAPDEVA

- **16/sept/2024** Se aprueba por parte del equipo técnico de JAPDEVA la propuesta del Proyecto, Continua para
- Proyecto se encuentra inscrito en MIDEPLAN N° Registro: **003458**
- **Monto proyecto:** Más de ¢10mil millones de colones
- **Alcance del proyecto:** Asfaltado 24km, aceras peatonales, cunetas revestidas, pasos de alcantarilla, muros de gaviones y ordenamiento con señalización vial (Ejemplo Puerto viejo).

ETAPA 1: Cuadrantes de Puerto Viejo 3,8km

ETAPA 1: Cuadrantes de Puerto Viejo 3,8km							PROPUESTA DE EJECUCIÓN	
ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	MONTO	APORTE JAPDEVA	APORTE MUNICIPALIDAD	FIRMA DE CONVENIO PRIMER SEMESTRE 2025	INICIOS DE PROCESOS DE CONTRATACIÓN Y EJECUCIÓN SEGUNDO SEMESTRE 2025
1,1	CAMINO C7-04-33 / CAHUITA (Puerto Viejo - Calles y Cuadrantes): 3,80km	km	3,80	¢1 897 269 996,50	¢1 803 992 176,50	¢93 277 820,00		
1,3	CONTROL DE CALIDAD, REAJUSTE DE PRECIOS DE LEY E IMPREVISTOS DE OBRA	global	1,00	¢279 577 916,61	¢143 045 948,98	¢143 188 783,81		
COSTO ETAPA 1				¢2 176 847 913,11	¢1 947 038 125,48	¢236 466 603,81		
					89,44%	10,86%		
					% Aporte JAPDEVA	% Aporte Municipalidad Talamanca		



JUNTA DE ADMINISTRACIÓN
PORTUARIA Y DE DESARROLLO
ECONÓMICO DE LA VERTIENTE
ATLÁNTICA

GOBIERNO
DE COSTA RICA

GAD-240-2024
16 de septiembre 2024

Lic Rugeli Morales Rodríguez
Alcalde- Municipalidad de Talamanca

Referencia: Aceptación de propuesta.

Estimado Señor:

Reciba un cordial saludo de parte de La Gerencia de Desarrollo de La Junta de Administración Portuaria y de Desarrollo Económico de la Vertiente Atlántica (JAPDEVA).

Se remite oficio **UGD-PID-065-2024**, donde nuestro equipo de la Unidad de Gestión para el Desarrollo, en seguimiento al proceso posterior a la postulación del siguiente proyecto:

Proyecto de conservación de la superficie de ruedo y sistemas de drenaje de 24 km de la red vial Cantonal en lastre, sobre las rutas municipales camino C7-04-19 (Bribri - Suretka): 7,8km/Camino C7-04-114 (Cuadrantes de Suretka): 1,00km/ Camino C7-04-005 (Vollo a Chase): 2,00km/Camino C7-04-063 (Vollo a Río Caribón): 1,4km/ camino C7-04-13 (Suretka-Amubre): 8km/ Camino C7-04-33 (Puerto Viejo - Calles y Cuadrantes): 3,8km.

Cumple con los requisitos de aceptación de la propuesta para continuar con el proceso de análisis para optar por financiamiento de proyectos según lo expuesto en el Reglamento para el financiamiento de proyectos de desarrollo con fondos de canon de explotación de la terminal de contenedores de Moín y de la contribución al desarrollo regional, de manera que se le asigna el número de seguimiento **24-01-0005**.

Atentamente,
ANNER GARCIA
OBREGON
(FIRMA)

Firmado digitalmente
por ANNER GARCIA
OBREGON (FIRMA)
Fecha: 2024.09.17
11:59:46 -06'00'

Lic. Anner García Obregón
Gerente - Desarrollo.

C : Ing Fernando Abdelnour Vega - Unidad de Inversiones Para el Desarrollo
Ing. Edgar Villarreal Ruiz - Unidad de Inversiones Para el Desarrollo
Exp/ Archivo



Obras pluviales Hone Creek

ITEM	DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	COSTO	APORTE CORBANA	APORTE MUNICIPAL
1	Camino C7-04-028 Comunidad de Hone Creek y Camino C7-04-030 comunidad de Patiño						
1.1	Construcción de cunetas revestidas de concreto f'c 210 kg/cm2 de 10cm espesor.	m2	3 546,00	€18 000,00	€63 828 000,00	€54 253 800,00	€9 574 200,00
1.2	Cabezales de concreto resistencia f'c 210 kg/cm2	m3	69,00	€183 553,00	€12 665 157,00	€10 765 383,45	€1 899 773,55
1.3	Cajas de registro Pluvial	c/u	2,00	€850 000,00	€1 700 000,00	€1 445 000,00	€255 000,00
1.4	Lastre para excavaciones y sustitución para obras de evacuaciones pluviales	m3	150,00	€20 000,00	€3 000 000,00	€0,00	€3 000 000,00
1.5	Back hoe.	horas	200,00	€21 000,00	€4 200 000,00	€4 200 000,00	€0,00
1.6	Vagoneta	horas	200,00	€20 500,00	€4 100 000,00	€0,00	€4 100 000,00
	SUB-TOTAL				€89 493 157,00	€70 664 183,45	€18 828 973,55
	LABORATORIO DE VERIFICACIÓN				€1 509 213,03	€1 509 213,03	€0,00
	TOTAL GENERAL				€91 002 370,03	€72 173 396,48	€18 828 973,55



**Avance general de
40%**



RECONSTRUCCIÓN 3 PASOS EN CARBÓN 1 **¢ 120 millones**

- Inicio 11 de noviembre 2024 pasos de alcantarilla en carbón 1,



Paso 1 de Alcantarilla: En Carbón 1 ya se encuentra listo al **100%**, CNE Municipalidad Talamanca



Avance general de
70%

Paso 2 de Alcantarilla: En Carbón 1 ya se encuentra listo al **100%**, CNE Municipalidad Talamanca.



Propuesta proyectos para Plaza de Futbol Puerto viejo.




DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN MEJORAS Y RECONSTRUCCION DE LAS CANCHAS DE FUTBOL DE PUERTO VIEJO Y BRIBRI TALAMANCA, LIMÓN

ITEM	NOMBRE DE PROYECTO	MONTO	APORTES POR INSTITUCIÓN	
			INDER	MUNICIPALIDAD DE TALAMANCA
1-	Diseño y Reconstrucción de la cancha de futbol en la comunidad de Puerto Viejo	¢1 895 292 375,88	¢1 764 833 875,88	¢130 458 500,00
			91,10%	8,90%
	NOTAS:		% DE APORTES	
	1-APROBADOS POR CONSEJO TERRITORIAL			
	2-ANTEPROYECTO Y PROPUESTA COMPLETA			
	3-PENDIENTE INSCRIPCIÓN EN MIDEPLAN			

Propuesta Puerto viejo




Vista aérea

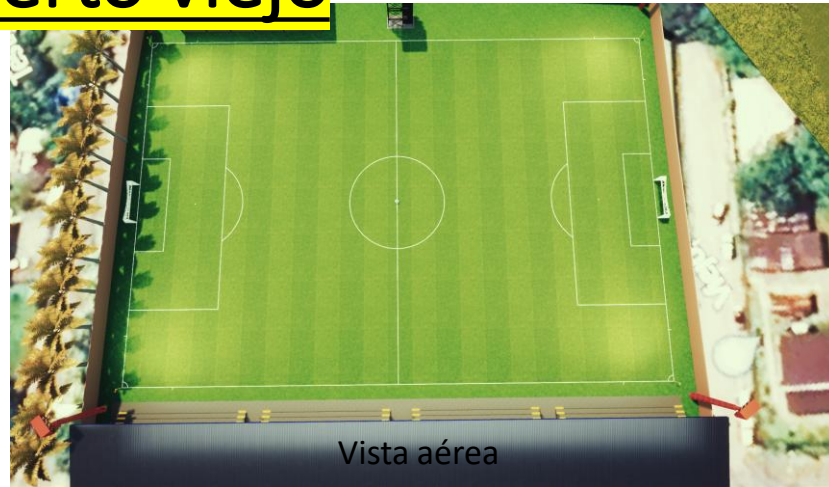

Vista aérea



Perspectiva

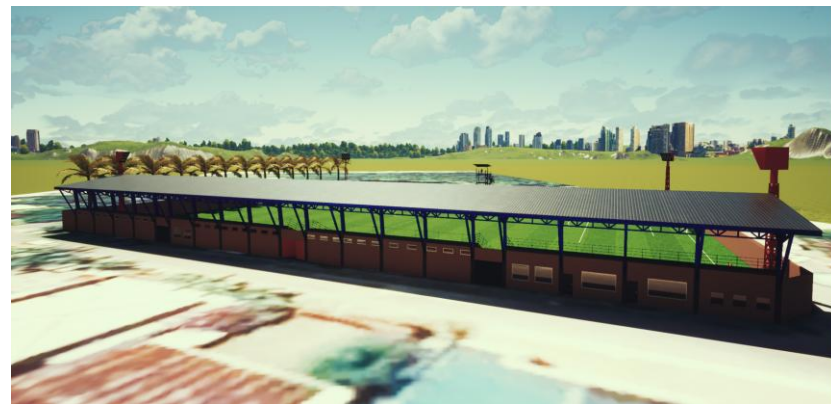

Vista Frontal accesos

Policita Turistica Cahuita



**Avance
General 70%**


- Diciembre 2024 salió a concurso contratación CNE – PROERI – CONAVI
- Se encuentra en estudio de ofertas.



PUENTE COCLES



Imagen del Levantamiento topográfico por LC topografía.

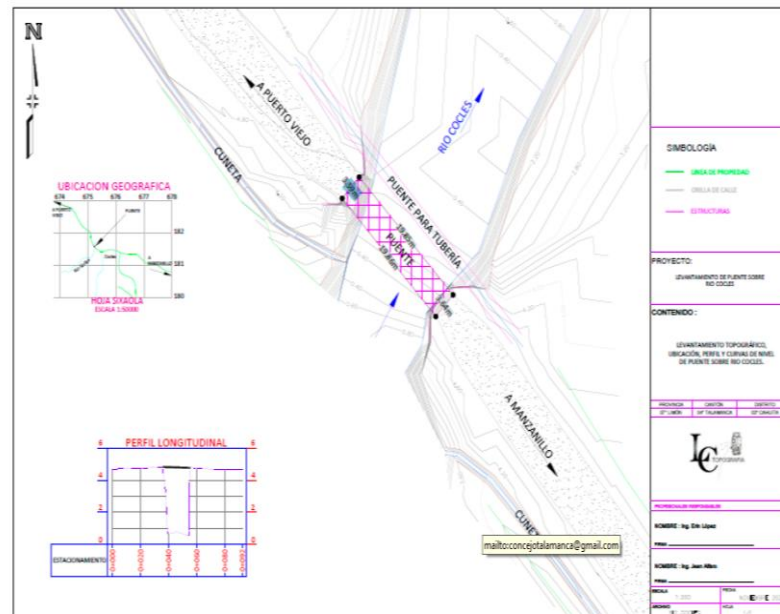

PROYECTOS RELEVANTES TELIRE



✓ Construcción de 3 Puentes en territorio Indígena en distrito Telire

- ✓ Katsi - Namuwoki: 45m
- ✓ En Coroma en rio Dueri: 40m
- ✓ En Sepecue Rio Choy: 30m

Costo
aproximado:
¢2 300millones

- INDER está inscribiendo en **MIDEPLAN**.
- Jueves 23/enero/2025 nos solicitan información Municipal, para actualizar datos en **MIDEPLAN**.
- Una vez que este inscrito en **MIDEPLAN**, sale a concurso.



INSTITUTO DE
DESARROLLO RURAL

GOBIERNO
DE COSTA RICA



RECONSTRUCCIÓN DE PASO EN SOKI

¢ 60 millones



- Cuando terminen paso 3 en carbón 1, suben a Soki.



ningun micrófono
No se ha encontrado ningún micrófono: conecte uno o difunde escuchando.

David...
MARCO...
Sergio...
Sergio...

no menor a 5m3 por paso.
_Contemplar un mínimo de 200m3 de gaviones ya colocados por cada paso de alcantarilla.
_Contratista debe contemplar la instalación de las alcantarillas según la normativa del CR2000

PASO 4 EN SOKI

Paso 4 en Soki

➤ **16/sept/2024** Se aprueba por parte del equipo técnico de JAPDEVA la propuesta del Proyecto, Continua para

➤ Proyecto se encuentra inscrito en MIDEPLAN N° Registro: **003458**

➤ **Alcance del proyecto:** Asfaltado 8km, aceras peatonales, cunetas revestidas, pasos de alcantarilla, muros de gaviones y ordenamiento con señalización vial (Ejemplo Puerto viejo).

- Se envía propuesta a JAPDEVA para asfaltados en Bratsi.

Asfalto en AMUBRI **8km convenio -** **JAPDEVA**

ETAPA 3: Camino Amubri 8,00km							PROPUESTA DE EJECUCIÓN	
ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	MONTO	APORTE JAPDEVA	APORTE MUNICIPALIDAD	FIRMA DE CONVENIO PRIMER SEMESTRE 2026	INICIOS DE PROCESOS DE CONTRATACIÓN Y EJECUCIÓN SEGUNDO SEMESTRE 2027
3,1	CAMINO C7-04-13 / TELIRE (Suretka-Amubre): 8,00km	km	8,00	€2 853 997 616,00	€2 732 420 597,00	€121 577 019,00		
3,2	CONTROL DE CALIDAD, REAJUSTE DE PRECIOS DE LEY E IMPREVISTOS DE OBRA	global	1,00	€356 093 282,55	€175 178 171,24	€187 571 927,49		
	COSTO ETAPA 3			€3 210 090 898,55	€2 907 598 768,24	€309 148 946,49		
					90,58%	9,63%		
					% Aporte JAPDEVA	% Aporte Municipalidad Talamanca		



Puente bailey - Sepecue 36m en Quebrada Shiragri



- Se encuentra en plantel Municipal – Antiguo puente Pan dulce.
- Se realizará con bastiones de gaviones.
- Se tienen que reparar piezas dañadas por la sal del mar (contratación de soldadura).
- Propuesta Monto para colocación





Dique Skuy y sherry

- Primer Impacto por 360horas
- Monto aproximado 14 millones



OTRO PROYECTOS CANTONALES



✓ CAIS TALAMANCA – ESTADO ACTUAL

- ORDEN INICIO DISEÑO 16/OCT/2024.
- ENTREGA DISEÑO 22/FEBR/2025
- **Costo final Adjudicado:** Más de **¢11.200 millones** de colones.
- **Licitación Mayor:** 2024LY-000001-0019300001.
- **Empresa:** Constructora Navarro y Avilés S.A.
- **Nombre del proyecto:** CONTRATACIÓN DE EMPRESAS CONSTRUCTORAS PARA LA ELABORACIÓN DE DISEÑO, CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO, PUESTA EN MARCHA Y MANTENIMIENTO ÁREA DE SALUD DE TALAMANCA.





**NAVARRO
Y AVILÉS**
EMPRESA CONSTRUCTORA





FIDEICOMISO INMOBILIARIO CCSS/BCR 2017

"CONTRATACIÓN DE EMPRESAS CONSTRUCTORAS PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE: ELABORACIÓN DE DISEÑO, CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO, PUESTA EN MARCHA Y MANTENIMIENTO DEL ÁREA DE SALUD DE TALAMANCA PARA EL FIDEICOMISO INMOBILIARIO CCSS / BCR 2017"

LICITACIÓN MAYOR 2024LY-000001-0019300001

Tabla Presentación de Oferta				
Línea	Descripción	Unidad	Precio colones	Precio dólares
1	Partida #1 Área de Salud Talamanca			
1.1	Etapa 2 Diseño	gbl		
1.1.1	Diseño	gbl	€ 447 768 000.00	
1.1.2	34% de equipamiento	gbl		\$ 47 368.80
1.2	Etapa 3 Construcción	gbl	€ 10 365 000 000.00	
1.3	Etapa 4 Equipamiento	gbl		\$ 3 225 000.00
1.4	Etapa 6 Puesta en Marcha	gbl	€ 25 000 600.00	\$ 20 896.00
1.5	Etapa 6 Mantenimiento	gbl	€ 399 052 500.00	\$ 257 236.20
	Total		€ 11 238 821 000.00	\$ 3 550 000.00

Etapa	Plazos entrega
2 – Diseño	Ítem D.1: Planos constructivos, especificaciones, memorias de cálculo, presentación de submittals. Máximo: 66 días hábiles. Ítem D.2: Permisos necesarios. 25 días hábiles.
3 -Construcción	Ítem C.1: 304 días hábiles totales. 282 días hábiles de construcción. 22 días hábiles proceso de recepción a satisfacción.
4-Equipamiento	Ítem E.1: 304 días hábiles que deberán cumplirse simultáneamente con el plazo del ítem C 1. de la Etapa 3. 282 días hábiles de construcción. 22 días hábiles proceso de recepción a satisfacción.
5-Puesta en marcha	Ítems PM.1 (Componente de construcción) y PM.2 (Componente de equipamiento) 86 días hábiles después de la recepción a satisfacción de la Etapa 3 y Etapa 4.

FORMULARIO DE PRESENTACIÓN DE PROYECTOS

Fecha: 27/08/2024

1. DATOS BÁSICOS DEL PROYECTO

1.1. Nombre del proyecto: BPIP 3296. Mejorar los componentes del sistema de Agua Potable de Cahuita, Puerto Viejo y Hone Creek, Talamanca, Limón.

1.2. Institución u organización proponente del proyecto: Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA).

1.3. Institución responsable (ejecutora): Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA).

1.4. Otras instituciones u organizaciones participantes: *Adjuntar notas de compromiso. N/A.

1.5. Datos del responsable técnico del proyecto:

Nombre: Kattia Sánchez Sánchez

Cargo: Director Diseño de Agua Potable y Edificaciones

E-mail (Institucional): kasanchez@aya.go.cr

Teléfono (Institucional): 2242-5000

1.6. Área de influencia: Cantón(es): Talamanca
Distrito(s): Bratsi y Cahuita.

1.7. Estado actual del proyecto: *Adjuntar la documentación de respaldo Perfil ☐ Prefactibilidad ☐

Factibilidad ☐ Diseño ☒ (concluido) Financiamiento ☐ Licitación y Contratación ☐

Pre-ejecución ☐ Ejecución ☐ Pre-Operación ☐ Operación ☐

1.8. Objetivo general: Mejorar los componentes del sistema de agua potable HCA-01 para mejorar las condiciones actuales y futuras de abastecimiento de las comunidades de Cahuita, Puerto Viejo y Hone Creek, en Talamanca, Limón.

1.9. Objetivos específicos:

- Construir un sistema de bombeo y tubería de impulsión desde la planta potabilizadora Sand Box hasta el tanque Catarata que permita elevar en total 80 L/s hacia el tanque que abastece los sistemas de Cahuita, Puerto Viejo y Hone Creek.
- Construir la línea de alimentación eléctrica trifásica de aproximadamente 550 m desde la Ruta 36 hasta el sitio donde se ubica el Pozo Sand Box 6, para contar con el suministro eléctrico adecuado para la extracción del caudal de este pozo.
- Equipar el Pozo Sand Box 6 con un equipo electromecánico que permita impulsar el caudal de producción hasta la planta potabilizadora Sand Box para contar con redundancia en las fuentes de producción del sistema.
- Implementar el control de nivel en el tanque Catarata por medio de sensores de presión y realizar la transmisión de datos a la planta potabilizadora para mejorar el control del

Mejorar los componentes del sistema de Agua Potable de Cahuita, Puerto Viejo y Hone Creek, Talamanca, Limón

- ❖ Construir un **sistema de bombeo y tubería** de impulsión desde la **planta potabilizadora Sand Box** hasta el **tanque Catarata**
- ❖ Construir la línea de alimentación eléctrica trifásica de **aproximadamente 550 m** desde la **Ruta 36** hasta el **sitio donde se ubica el Pozo Sand Box 6**
- ❖ Equipar el Pozo Sand Box 6 con un equipo electromecánico que permita impulsar el caudal de producción hasta la planta potabilizadora Sand Box
- ❖ Implementar el control de nivel en el tanque Catarata por medio de sensores de presión y realizar la transmisión de datos a la planta potabilizadora
- ❖ Población Beneficiada: 8514(2% de la población de la RHC)
- ❖ **COSTO TOTAL DEL PROYECTO (¢):2.182.590.306,96**
- ❖ Monto a financiar por JAPDEVA: **1.216.394.129,96 (44%)**



SUSTITUCIÓN DEL PUENTE SOBRE EL RÍO LA ESTRELLA, RUTA NACIONAL NO.36 EN VALLE LA ESTRELLA (PENSHURT)

- ❖ **Febrero 2025:** Compra Puente Modular
- ❖ Puente de **180 metros** de longitud
- ❖ **2025:** Construcción del Puente



- ❖ Costo Total: **8.645.323.130,67**
- ❖ Monto a financiar de parte de JAPDEVA:
8.343.987.310,32 (97%)

MAQUINARIA PARA CAMINOS DE TSB3

- Compactadora de hule
 - Tanque de emulsión
 - Barredora
 - Compactadora Rodillo Doble 4.5 T
-
- Costo de toda la maquinaria **¢760 millones**



PENDIENTE



Almacenamiento de Emulsión



Barredora



Compactadora de Hule



BackH

Compactadora d
4,5 tons

PENDIENTE



COMPRADO



COMPRADO

Maquinaria
Distribuidor agregados
Almacenamiento de emulsion
Distribuidor de emulsion
compactadora de hule
Barredora
Back hoe
Compactadora 10 toneladas
Compactadora rodillo doble 4.5 toneladas

LEMA: PASAR DE CAMINOS EN LASTRE A CAMINOS ASFALTICOS

CENTROS EDUCATIVOS APROBADOS POR EMERGENCIA CNE

<u>DISTRITO</u>	<u>CENTRO EDUCATIVO</u>	<u>METROS</u>	<u>MONTO DE INVERSIÓN</u>
Bratsi	Escuela Líder de Bribri	3,359 m ²	\$ 2 269 024,98
Bratsi	Escuela Monte Sion	600 m ²	\$ 679 922,32
Bratsi	Escuela de Shiroles	950 m ²	\$ 1 283 991,68
Bratsi	Escuela de Rancho	1200m ²	\$ 1 385 900,00
Sixaola	Liceo de Sixaola	3,872 m ²	\$ 2 232 233,62
<u>TOTAL</u>			\$ 7 851 072,6

- ❖ Ofertas el Lunes 02 de Septiembre 2024
- ❖ En procesos de contratación y firma de contratos





Electrificación Talamánca

Programa Desarrollo Periférico

Región Huetar Caribe

2024




Detalle de sectores y cantidad de clientes a beneficiar en el cantón de Talamánca año 2024

2023	45	56	CACHABRI, LOC 675-009	TALAMANCA	4	0,08	5,35	Diseñado - Condición cruce de río y maquinaria – PENDIENTE PARA PROGRAMAR EJECUCION EN 2025
2013	45	78	YORKIN, LOC	TALAMANCA	57	3,29	166,35	Diseñado - Condición cruce de río y maquinaria – PENDIENTE PARA PROGRAMAR EJECUCION EN 2025
2022	45	49	COROMA, TELIRE, LOC 979-004	TALAMANCA	22	1,06	64,48	Diseñado - Condición cruce de río y maquinaria – PENDIENTE PARA PROGRAMAR EJECUCION EN 2025
2021	45	57	DURURPE, TALAMANCA, LOC 900-023	TALAMANCA	41	1,76	110,21	Diseñado - Condición cruce de río y maquinaria – PENDIENTE PARA PROGRAMAR EJECUCION EN 2025
Total:					151	6,757	388,462	

PROYECTO ICE – INDER

2021	45	22	ALTOS DE CATARINA	TALAMANCA	13	2,116	111,41	Avance 50%
------	----	----	-------------------	-----------	----	-------	--------	------------

Propuesta para “Diseño e Implementación de redes de fibra óptica para localidades del cantón de Talamanca, por medio del convenio INDER – MUNICIPALIDAD DE TALAMANCA - ICE, 2023-2025”



Ejecución




Presupuesto
aproximado:
¢450millones



Longitud
aproximada:
120km

Distrito	Localidad	Condición de red	Coordenadas	
			Latitud	Longitud
Bratsi	Suretka	Solo servicio de voz	9.534871°	-82.944037°
Bratsi	Shiroles	Solo servicio de voz	9.586568°	-82.956810°
Bratsi	Gavilán Canta		9.590834°	-82.981064°
Bratsi	Chase	Red robada	9.597012°	-82.869537°
Bratsi	Bambu		9.553686°	-82.892464°
Telire	Yorkin		9.495250°	-82.838402°
Telire	Amubri	Solo servicio de voz	9.519142°	-82.953874°
Telire	Kachabri		9.553753°	-83.008299°
Bratsi	Olivia	Red robada	9.611354°	-82.791368°
Bratsi	Sand Box	Red robada	9.617408°	-82.822994°
Sixaola	Margarita	Bajo ancho de banda	9.600714°	-82.751571°
Sixaola	Paraíso	Bajo ancho de banda	9.569998°	-82.714806°
Sixaola	Celia	Red robada	9.543305°	-82.682207°
Sixaola	Daytonia	Red robada	9.524956°	-82.663197°
Sixaola	La Palma	Bajo ancho de banda	9.527092°	-82.633488°
Sixaola	Gandoca	Bajo ancho de banda	9.583228°	-82.610523°
Cahuita	San Rafael de Bordón	Red robada	9.739470°	-82.896312°
Cahuita	Carbón 2	Red robada	9.698374°	-82.842899°
Cahuita	Comadre	Red robada	9.710102°	-82.821281°
Cahuita	Punta de riel	Bajo ancho de banda	9.682106°	-82.808177°

INSTALACION REDES DE FIBRA ÓPTICA

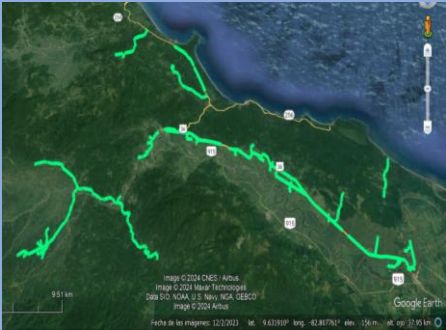

Estado Actual

En proceso de inscripción a MIDEPLAN

<u>NOMBRE DEL PROYECTO</u>	<u>MONTO</u>
<u>CAIS TALAMANCA</u>	¢ 11 000 000 000,00
<u>MEJORAS EN EL MERCADO Y RECONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE SERVICIOS MÚLTIPLES DE SIXAOLA</u>	¢ 2 711 291 326,55
<u>Asfaltatado 24km JAPDEVA-Municipalidad</u>	¢10 000 000 000,00
<u>Obras Pluviales Hone Creek y Swicth</u>	¢121 000 000,00
<u>ASFALTADO 1KM ADICIONAL CAMINO C7-04-019</u>	¢ 317 000 000,00
<u>Construcción de 3 Puentes en territorio Indígena en distrito Telire</u>	¢ 2 300 000 000,00
<u>Puente Penshurt</u>	¢ 8 645 323 130,67
<u>PUENTE QUEBRADA SEPECUE</u>	¢ 350 000 000,00
<u>EQUIPO TSB3</u>	¢ 758 000 000,00
<u>Mejorar los componentes del sistema de Agua Potable de Cahuita, Puerto Viejo y Hone Creek, Talamanca, Limón</u>	¢ 2 182 590 306,96
<u>RECONSTRUCCIÓN DE PASO EN SOKI Y 3 PASOS EN CARBÓN 1</u>	¢ 190 000 000,00
<u>MAQUINARIA EXCAVADORA PARA SKUY Y SHERRY</u>	¢ 13 000 000,00
<u>Centros educativos cne y otros proyectos ice, puente Cocles</u>	¢ 5 500,000,000,00
<u>TOTAL APROXIMADO</u>	<u>¢ 46 mil millones</u>

GRACIAS!!

